



Município de Bom Princípio
Cnpj: 90.873.787/0001-99
Telefone: (51)36348100
Email: camara@bomprincípio.rs.gov.br
Endereço: Av. Guilherme Winter, 65
Cidade: BOM PRINCÍPIO
Estado: RS
Cep: 95765-000

Processo Administrativo nº 2024 / 2631

Requerente: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCÍPIO

Endereço: RUA DOS GERANEOS

UF: RS

Ouvidoria: 5136341019
Comercial:

Ouvidoria:

Residencial:

CPF / CNPJ:

CEP: 95765-000

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Descrição: REFERENTE A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO TERMO DE FOMENTO Nº 027/2023.

Observações:

Município de Bom Princípio , 05 de junho de 2024



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I - MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 001/2024

Bom Princípio/RS 01 de Junho de 2024

Excelentíssima Senhora

LILIAM JUCHEM

Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Termo de Colaboração nº 027/2023

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas Final, dos recursos repassados pelo Município Bom Princípio, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 027/2023, com fundamento no que dispõem a Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 018/20107 e a Lei Municipal nº 2.678/2018 de 04 de dezembro de 2018 ,composta dos seguintes documento anexos, notas fiscais e extratos bancários, depósitos das aplicações.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Fagan Vieceli
Presidente Associação Comunitária Bom Princípio

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019





ANEXO II - DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

CONTADOR CRC/RS 61815
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019





MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Paulo Roberto Fagan Viecei Presidente Associação Comunitária Bom Princípio	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 027/2023
---	--

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de nº 027/2023 Parceria/Fomento em 13.12.2023	0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela	451.938,16
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	6.143,52
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	104.318,19
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	104318,19
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 24.09.2019 (j - k - l)	353.763,49

Data.01.06.2023

Paulo Roberto Fagan Viecei Presidente Associação Comunitária Bom Princípio	Paulo Roberto Fagan Viecei-Assinatura e nome do contador da Entidade
---	--

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação E5482202.3E69A104	Data/Hora da Emissão 15/05/2024 - 13:16:54			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 378			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	TECNICA CONSTRUÇOES LTDA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	AV DOM VICENTE, 137				
	Bairro	DOM VICENTE				
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL				
Cep	95765-000		Cpf/Cnpj	04.122.041/0001-01		
E-mail	escritoriotechnica@hotmail.com		Insc. Mun.	1324		
			Insc. Est.	2330011290		
			Telefone/Celular	NaN / (51)980172887		
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCÍPIO					
CPF/CNPJ	07.779.946/0001-47					
Endereço	RUA DOS GERANEOS, 248					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000					
E-mail						
	Inscrição Estadual	ISENTO				
	Telefone	5136341019				
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	104.318,19	87.650,17	0,00	16.668,02	5,0000	833,40
Detalhamento da Atividade						
7.02						
EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2023 REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL SÃO PEDRO CANÍSIO, CNO 90.018.96449/72.						
MATERIAL R\$ 87.650,17 E MÃO DE OBRA R\$ 16.668,02. TOTAL DA MEDIÇÃO 01 R\$ 104.318,19.						
DADOS BANCARIOS: BANRISUL AG 0142 CC 06.056369-0-5.						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
104.318,19	0,00	0,00	87.650,17	16.668,02	0,00	95.548,69
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 104.318,19						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
104.318,19	678,07	3.129,55	1.043,18	1.251,82		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
1.833,48	0,00	833,40	95.548,69			
Outras Informações						
• Construção civil - CNO: 90.018.96449/72 ART: 13151298 Local da Construção: RUA PEDRO CANÍSIO, Nº 27, CENTRO - BOM PRINCÍPIO • Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/06/2024 • Esta nota equivale ao RPS nº 378, emitido em 15/05/2024 13:16:54 • Data do Fato Gerador desta Nota: 15/05/2024 • Emitido por ISS Variável. • Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14030.80(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 4005.82 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE TECNICA CONSTRUÇOES LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/05/2024 - 13:16:54. TOMADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCÍPIO. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 95.548,69				Nota	378	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS MORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01564568636/00000000685325/071127

Data: 15/05/2024

Hora: 16:24:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 15/05/2024
Valor: R\$ 95.548,69
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0142-06.069168.0-4
Nome do Remetente: PARCERIA 27 2023
Conta do Destinatário: 0142-06.056369.0-5
Nome do Destinatário: TECNICA CONSTRUcoes LTDA
Finalidade: PAGAMENTO NOTA FISCAL 378

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03AD4DC119CD7FCB62FB05F0831E8C352C65

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.779.946/0001-47	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCIPIO		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 30/09/2024	Número do Documento 07.16.24137.8935076-7	Pagar este documento até 30/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232434681			Valor Total do Documento 7.936,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.251,82			1.251,82
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.850,80			4.850,80
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.833,48			1.833,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
	CNO:90.018.96449/72 CNPJ Prestador:04.122.041/0001-01				
Totais		7.936,10			7.936,10



PAULO ROBERTO FAGAN VIECEI
CONTADOR CRC/R8 81815
CPF 264.710.780-72
RUA DAS MONTENSIAS 121
BOM PRINCIPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

16/05/2024 14:31:21

85800000079 8 36100385242 4 74071624137 8 89350767305 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8	36100385242 4	74071624137 8	89350767305 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.779.946/0001-47
Número: 07.16.24137.8935076-7
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 7.936,10

Pague com o PIX





banrisul

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0142-06.069168.0-4
Correntista : PARCERIA 27 2023
Data/Hora Operação : 31/05/2024-09:55:24
NSU : 01567815751/00000000283894/075990
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85800000079 36100385242 74071624137 89350767305
Data de Pagamento : 31/05/2024
Número do Documento : 07.16.24137.8935076-7
Valor Total : 7.936,10

Autenticação : 041014299980759903105202400000793610

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

031A1D28613AD6DDF3F52F3903BAA18FFF68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI



CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCÍPIO-RS
FONE: (51) 9 9834-3795
(51) 3634-1019

**PM BOM PRINCIPIO**

Av Guilherme Winter, 65, BOM PRINCIPIO / RS

CEP: 95765-000 TELEFONE: (51)36348100

GUIA ISS EVENTUALCONTRIBUINTE: 2306 - TECNICA CONSTRUcoes LTDA
ENDEREÇO: AV DOM VICENTE, 137

CPF/CNPJ: 04.122.041/0001-01

CEP: 95765-000

CADASTRO: 1324

EXERCÍCIO: 2024

PARCELA: 5

OBSERVAÇÃO: Tomador ACBP - 07779946000147

DÍVIDA: ISS RETIDO EVENTUAL

Nota Fiscal	Data Emissão	Base Calculo	Alíquota	Valor Imposto	Observação
378	15/05/2024	16668.02	5,0000%	833,40	

ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS E VALORES

ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS DA RECEITA		VALORES PARA COBRANÇA	
ISS RETIDO EVENTUAL	833,40	BASE CÁLCULO:	0,00
		VALOR ORIGINAL:	833,40
		VALOR ACRÉSCIMO:	0,00
		CORREÇÃO MONETÁRIA:	0,00
		VALOR MULTA:	0,00
		VALOR JUROS:	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR:	833,40
		GUIA CORRIGIDA ATÉ:	15/06/2024

Corte na linha pontilhada

CONTRIBUINTE: TECNICA CONSTRUcoes LTDA		CADASTRO: 1324
ENDEREÇO: AV DOM VICENTE, 137		CPF / CNPJ: 04.122.041/0001-01
IMPOSTOS / TAXAS		VALOR PARA COBRANÇA
ISS RETIDO EVENTUAL	833,40	BASE CÁLCULO: 0,00
		VALOR ORIGINAL: 833,40
		VALOR ACRÉSCIMO: 0,00
		CORREÇÃO MONETARIA: 0,00
		VALOR MULTA: 0,00
		VALOR JUROS: 0,00
		TOTAL A PAGAR: 833,40
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO CONVENIADO		Vencimento: 15/06/2024
Cedente: PM BOM PRINCIPIO		Corrigida até: 15/06/2024
Instruções: APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA TESOUREARIA MUNICIPAL		Guia: 29485523
81630000008-9 33400608202-1 40615000029-6 48552300000-1		

PAULO ROBERTO FAGAN VIECELI
CONTADOR CRC/RS 61615
CPF 264.710.780-72
RUA DAS HORTÊNSIAS 121
BOM PRINCIPIO-RS
FONE: (51)9 9834-3795
(51) 3634-1019



Recibo de Pagamento

Número: 01567813255/00000000278289/075985

Data: 31/05/2024

Hora: 09:52:36

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0142-06.069168.0-4-PARCERIA 27 2023

Valor: 833,40

Data Débito: 31/05/2024

Data Vencimento: 15/06/2024

Código Barras: 81630000008.9 33400608202.1 40615000029.6 48552300000.1

Tipo Documento: Arrecadação - PM BOM PRINCIPIO

035FA01E03BACF2C609680B42152A6481347

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL
AGENCIA: 0142 - BOM PRINCIPIO
CONTA.: 06.069168.0-4
NOME.: PARCERIA 27 2023
IDENTIFICACAO: 01202406010772622980

01/06/2024

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 353.762,49
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 353.729,68
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA.
(B) TOTAL.....R\$ 32,81

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 03/06/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 353.772,53

+-----+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 14/12/2023		1,00
++ MOVIMENTOS MAI/2024		
15	RESGATE AUTOMATICO	000000 95.550,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	071127 95.548,69-
	SALDO NA DATA	2,31
31	RESGATE AUTOMATICO	000000 8.800,00
	PAGAMENTO PREFEITURA	075985 833,40-
	PAGAMENTO DARF	075990 7.936,10-
	SALDO NA DATA	32,81

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:29 DE 01/06/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2024 A 30/04/2024

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCIPI	07.779.946/0001-47	0142	06.069168.0-4

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL

14/12/2023		451.937,16	AUTOMATICO	721	PRE	04/12/2025
31/03/2024	SLD ANTER	451.937,16		3.072,79		
30/04/2024	SLD ATUAL	451.937,16		6.589,04		
				988,35		457.537,85

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		451.937,16
RENDIMENTO ATE 31/03/2024:		3.072,79
TOTAL:		455.009,95

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

SALDO FINAL		
CONTRATADO:		451.937,16
RENDIMENTO:		6.589,04
SALDO FINAL BRUTO:		458.526,20
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		988,35
SALDO FINAL LIQUIDO:		457.537,85

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

B A N R I S U L
AGENCIA: 0142 - BOM PRINCIPIO
CONTA...: 06.069168.0-4
NOME...: PARCERIA 27 2023
PERÍODO: DEZEMBRO/2023
IDENTIFICACAO: 01202406010772621953

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 08/11/2023 0,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2023
14 CREDITO TRANSFERENCIA 010439 451.938,16
APLICACAO AUTOMATICO 000000 451.937,16-
SALDO NA DATA 1,00

----- EMITIDO AS 09:27 H DE 01/06/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01										
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Quantidades			Valores			Percentual medido
				Acumulado anterior	Medição Atual	Acumulado total	M. O.	MAT.	Total	
3	ETAPA 1 - RESTAURO SETOR CULTURAL/EDUCACIONAL - BLOCO LESTE									
3.1	Cobertura - Etapa 01									
3.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	456,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	456,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	456,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	137,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	137,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.7	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1757,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	156,73		156,73	156,73	283,31	75,23	338,54	100,00%
3.1.9	Revisão e recuperação barrotes forro	M	652,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.10	Restauro Forro de Madeira	m²	495,57		189,52	189,52	4.014,19	15.234,58	19.248,77	34,21%
3.1.11	P 91 - base da ORSE (3754) - Forro de madeira de lei angelim ou cedro, em régua c/20 a 25 cm de largura, incl. madeiramento de suporte (sarrafo), inst.	m²	389,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.12	Demolição Roda Forro	m	666,80		666,80	666,80	1.848,50	499,95	2.148,45	100,00%
3.1.13	Roda forro em madeira	m	644,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.14	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).	M	22,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.15	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	30,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.16	Revisão de estruturas de madeira	m²	456,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.17	remoção de forro de madeira - sem reaproveitamento	m²	19,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ETAPA 2 - REFORMA SETOR SAÚDE									
5.1	Cobertura - Etapa 02									
5.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	717,58		126,00	126,00	395,84	123,48	519,12	17,66%
5.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	717,58		630,00	630,00	0,00	51.842,70	51.842,70	87,80%
5.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	717,58		126,00	126,00	531,72	0,00	531,72	17,66%
5.1.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25,00		3,00	3,00	194,84	372,84	567,48	12,00%

5.1.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M., PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	UN	25,00		3,00	3,00	2.769,37	5.831,07	8.590,44	12,00%
5.1.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m²	215,39		37,30	37,80	1.108,30	1.942,16	3.050,46	17,55%
5.1.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	215,39		37,80	37,80	255,91	78,76	335,66	17,55%
5.1.7	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2448,96		244,08	244,90	2.789,37	4.662,82	7.452,19	10,00%
5.1.8	Revisão de estruturas de madeira	m²	717,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.9	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,84		20,23	20,23	33,99	9,71	43,70	33,25%
5.1.10	remoção de forro de madeira sem reaproveitamento		61,58		61,58	61,58	102,81	30,78	133,59	100,00%
5.1.11	Revisão e recuperação barrotes forro	M	929,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.12	Restauração Forro de Madeira	m²	742,58		74,55	74,55	1.785,42	6.700,08	8.485,49	10,04%
5.1.13	P 01 - base de ORSE (3754) - Forro de madeira de lei angelim ou cedro, em régua c/20 a 25 cm de largura, incl. modelamento de suporte (sarrafo), Inst.	m²	429,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.14	Demolição Roda Forro	m	976,14		326,67	326,67	606,88	245,00	1.051,89	33,47%
5.1.15	Roda forro em madeira	m	897,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.16	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	78,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	31,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Pluvial									
12.1	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	316,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	93,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	140,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORN. E ASSENT.	M	68,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	28,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VALOR TOTAL MEDIÇÃO 01							R\$ 16.668,02	R\$ 87.856,17	R\$ 104.318,19	6%

1.245.013,39	Valor total Contratado
104.318,19	Medição 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A MEDIÇÃO 01 – REFORMA HSPC


Mobilização da obra

A Empresa executou uma instalação provisória de energia elétrica, visto que no local não há funcionamento de tomadas e quadros. Também executou uma entrada provisória de água.

Remoção de forro PVC, Remoção de forro de madeira E Remoção de rodaforro de madeira.


Iniciada a execução das remoções internas de forro de PVC, rodaforro de madeira e forro de madeira, nas salas conforme memorial de cálculo anexo a medição. Conforme conversamos com a Fiscal Liege e também com César e Daniela, o forro no local está totalmente deteriorado pelos cupins, e os que não estão, não se consegue tirar sem quebra da madeira. Por esse motivo, estão sendo removidos os forros de todas as salas, e serão selecionados os melhores para fazer uma área de "memória" do antigo hospital.

Incluído nesse item a remoção de luminárias e isolamento do cabeamento elétrico.

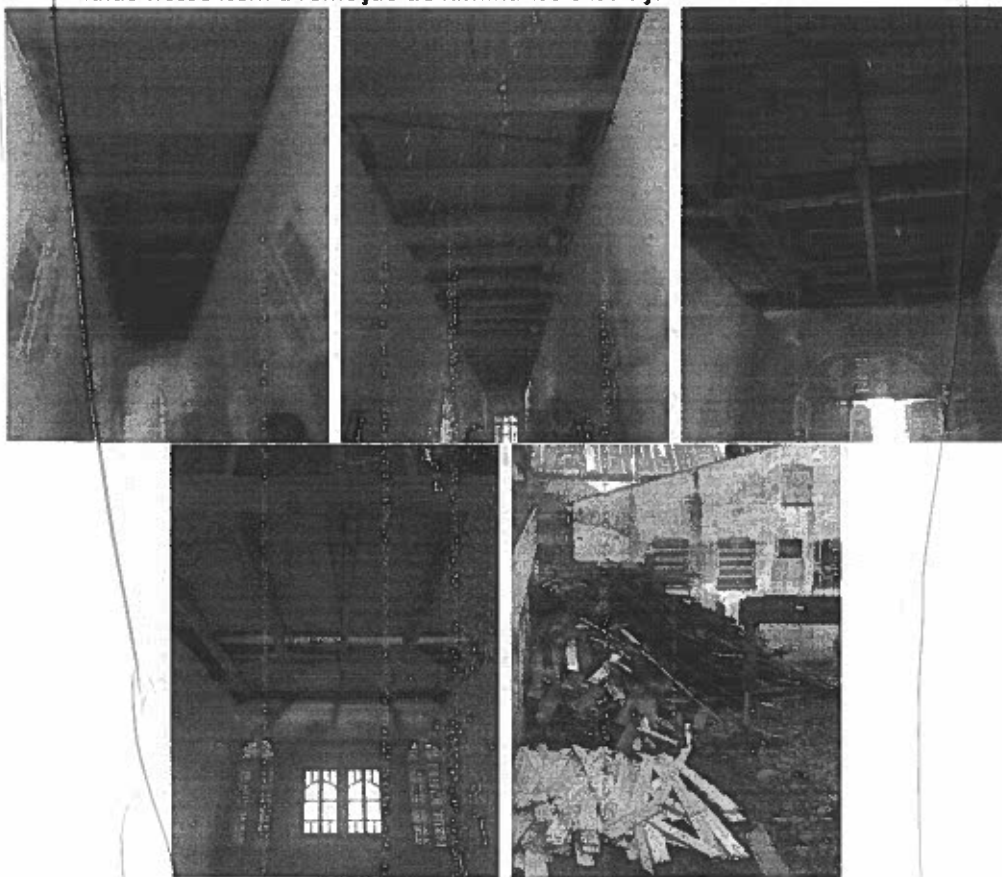




Remoção de telhas e novo telhamento.

Executada a remoção de 126m² de telha existente e colocação de telha nova. Além disso, já há material disponível para execução de 630m² de telhado. Para não molhar as madeiras internas, só estão sendo removidas as telhas que se consegue efetivamente colocar no mesmo dia.

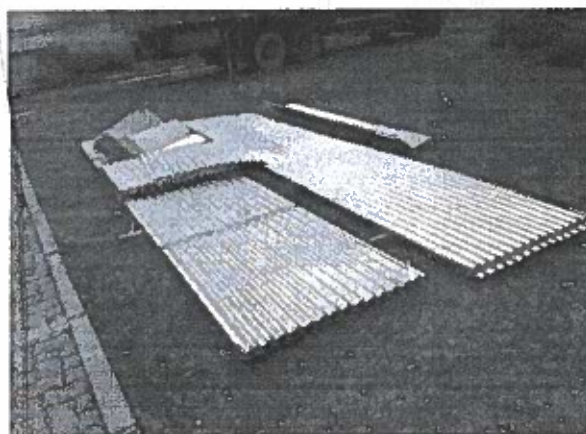

Remoção de tesouras e trama de madeira, fabricação e instalação de novas tesouras e tramas de madeira e pintura imunizante para madeira

Após a remoção das telhas, com a devida iluminação, foram feitas as verificações das madeiras existentes no local. As madeiras deterioradas pelos cupins foram substituídas por madeiras novas. As novas madeiras foram instaladas, e toda a estrutura (nova e existente) recebeu aplicação de 02 demãos de imunizante Jimo Cupim.

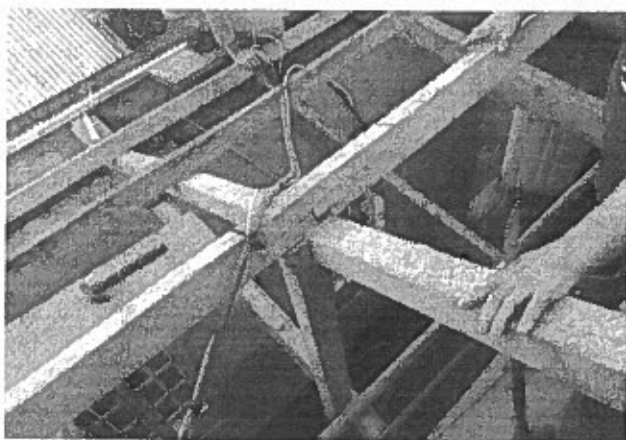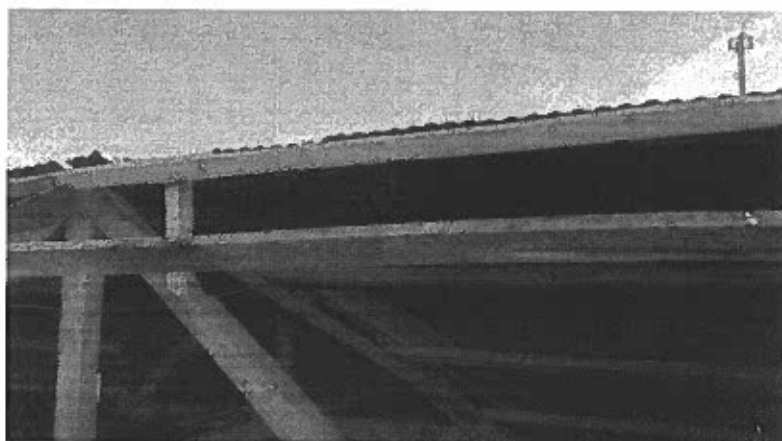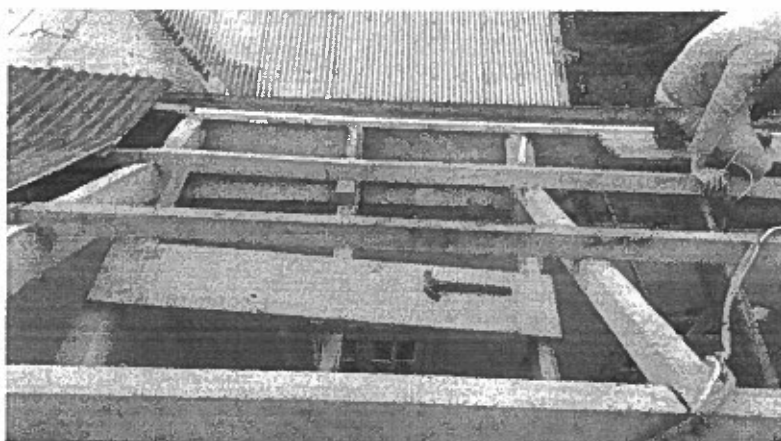

Conferido em 10/05/24

Lige Baumgratz

Lige Baumgratz
Arquiteta e Urbanista
CAU A48805-4
CPF 963.111.770-72





PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo Nº: 2024/2631

Sequência: 2

Requerente: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCIPIO

Remetente: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - ISSQN

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Destinatário: ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS

Data de Despacho: 06/06/2024

Despacho: Notas fiscais de prestação de serviço verificadas pela fiscalização municipal.

Visto em 06/06/2024.

Encaminhado para continuidade do processo.

MATHEUS HENRIQUE WELTER

Fiscal Tributário



PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo Nº: 2024/2631

Sequência: 3

Requerente: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCIPIO


Remetente: ASSESSORIA TÉCNICA DE PROJETOS

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Destinatário: SECR. MUN. DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Despacho: 10/06/2024

Despacho: Para gestor analisar



Daniela Steffen
Assessora



PM BOM PRINCIPIO

90.873.787/0001-99

Av Guilherme Winter, 65

BOM PRINCIPIO-RS / 95765-000

(51)36348100

Processo Nº: 2024/2631

Sequência: 4

Requerente: ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCIPIO

Remetente: SECR. MUN. DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto: ENTREGA PRESTACAO DE CONTAS

Destinatário: SETOR DE EMPENHOS E CONTRATOS

Data de Despacho: 12/06/2024

Despacho: MEMORANDO EM ANEXO
AUTORIZADO PAGAMENTO

Lilian Juchem
Secretária de Saúde e
Assistência Social

Lilian Juchem

Secretária de Saúde e Assistência
